


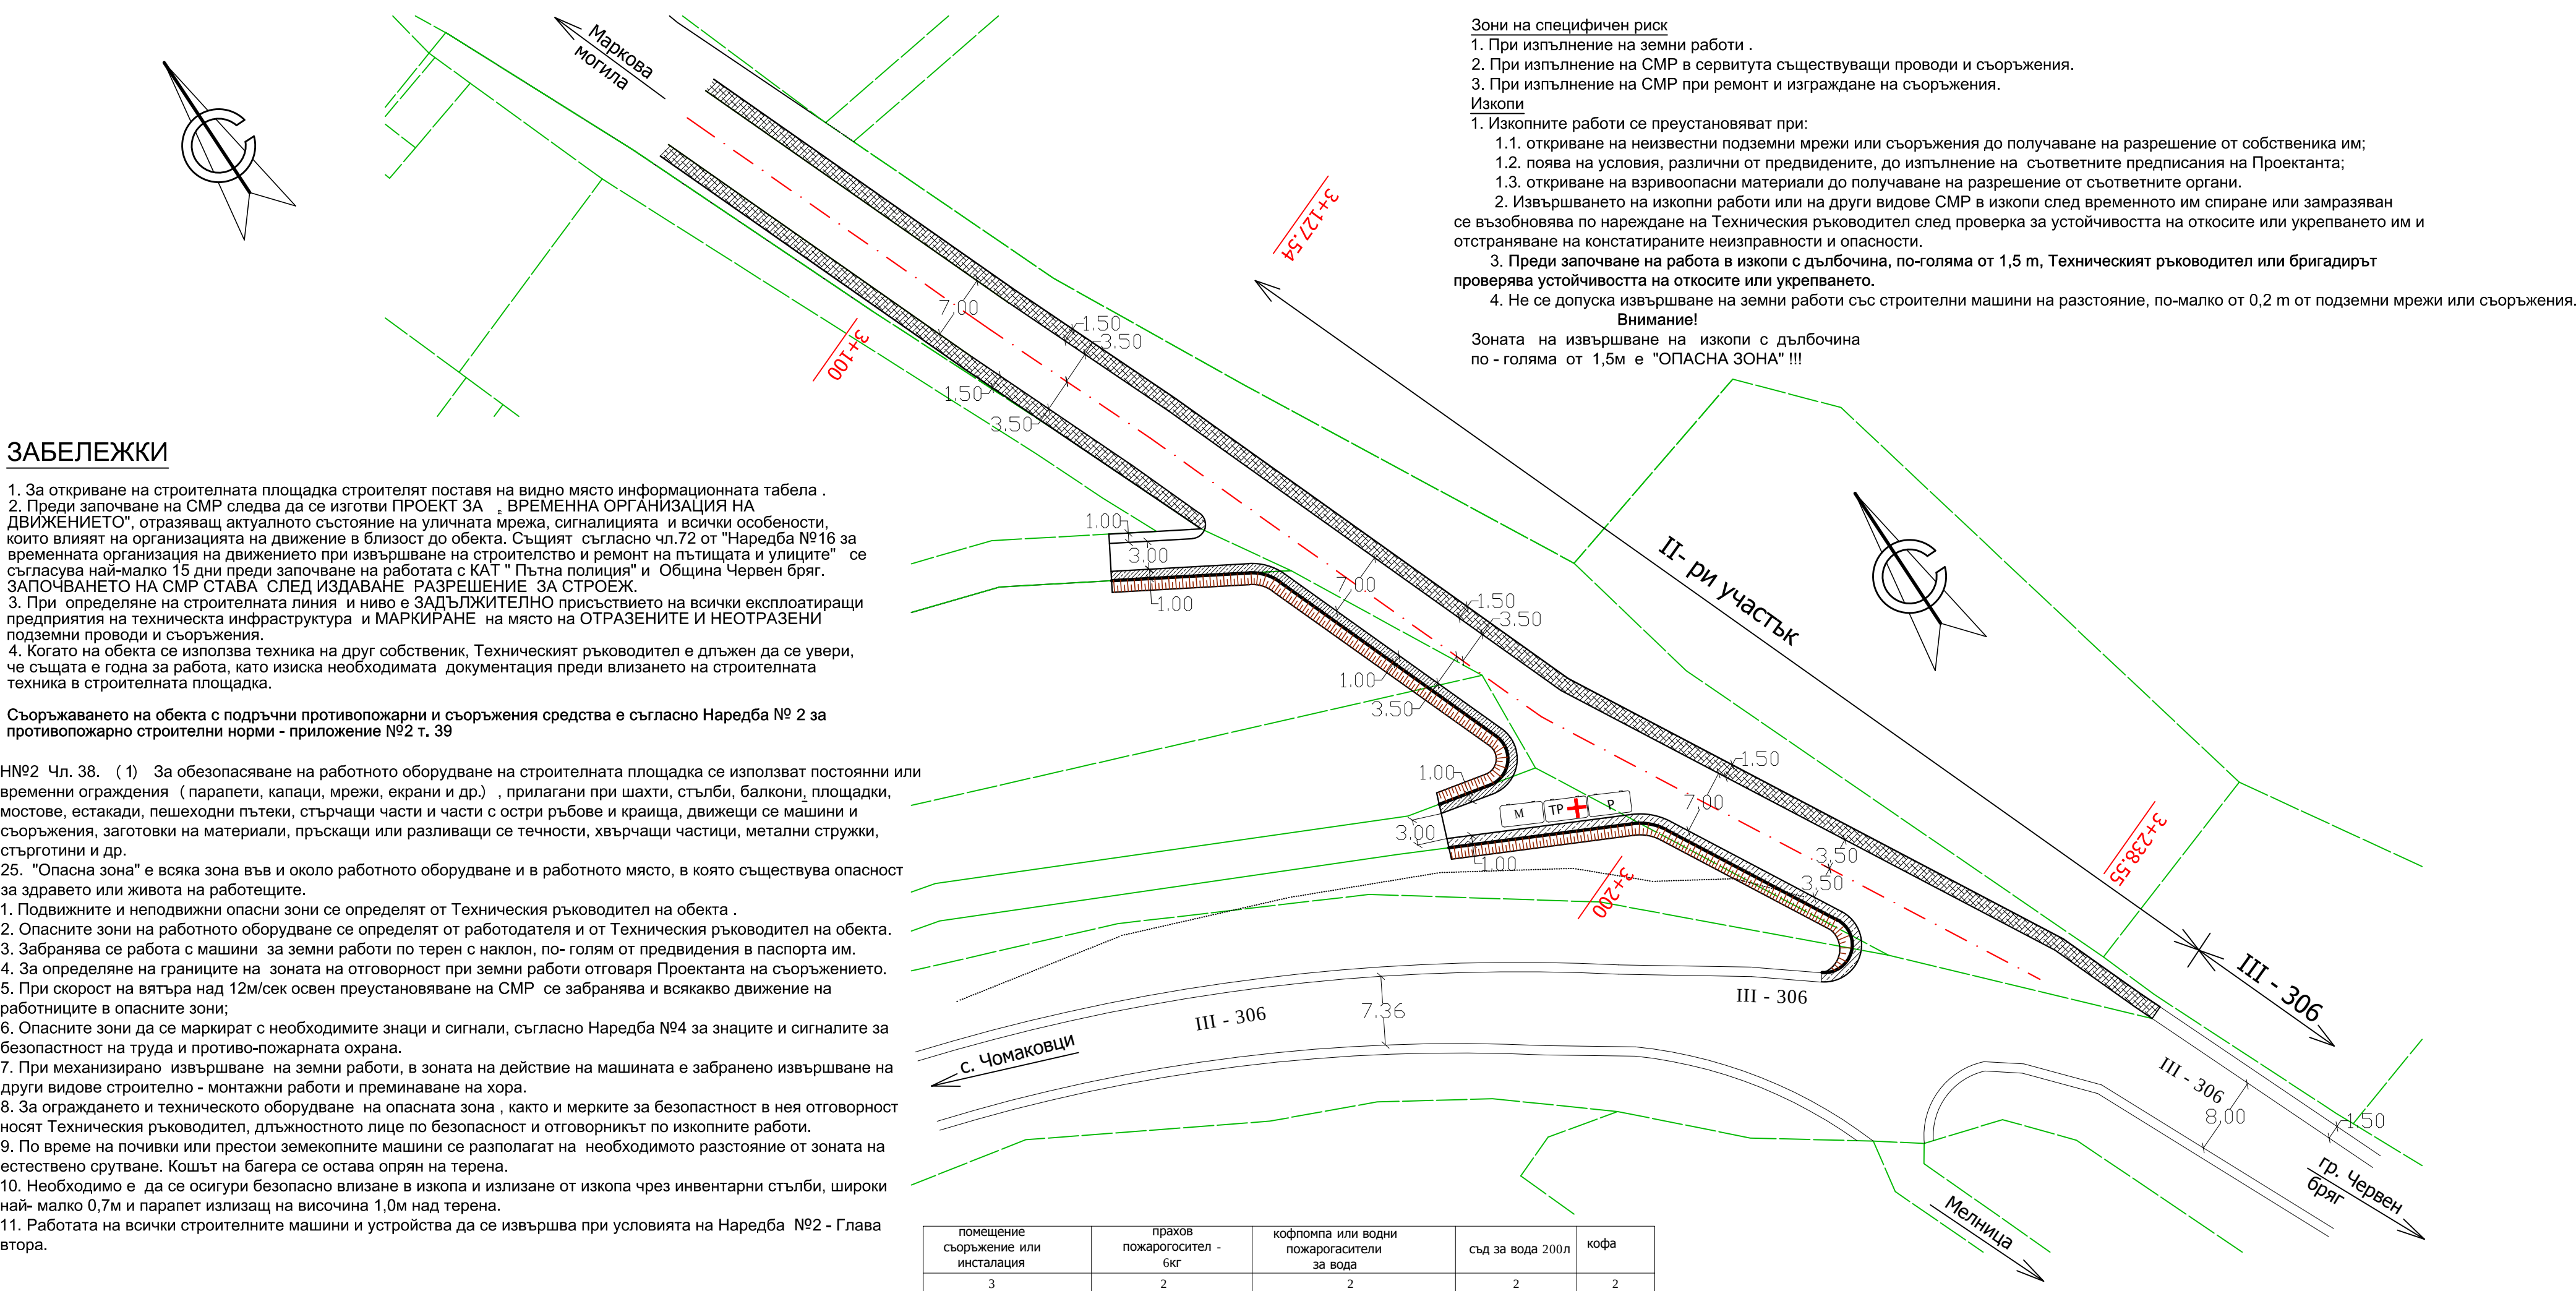

ЗАБЕЛЕЖКИ

- 1. За откриване на строителната площадка строителят поставя на видно място информационната табела .
- 2. Преди започване на СМР следва да се изготви ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО", отразяващ актуалното състояние на уличната мрежа, сигналицията и всички особености, които влияят на организацията на движение в близост до обекта. Същият съгласно чл.72 от "Наредба №16 за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътищата и улиците" се съгласува най-малко 15 дни преди започване на работата с КАТ "Пътна полиция" и Община Червен бряг. ЗАПОЧВАНЕТО НА СМР СТАВА СЛЕД ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ.
- 3. При определяне на строителната линия и ниво е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъствието на всички експлоатиращи предприятия на техническата инфраструктура и МАРКИРАНЕ на място на ОТРАЗЕНИТЕ И НЕОТРАЗЕНИ подземни проводни и съоръжения.
- 4. Когато на обекта се използва техника на друг собственик, Техническият ръководител е длъжен да се увери, че същата е годна за работа, като изиска необходимата документация преди влизането на строителната техника в строителната площадка.

Съоръжаването на обекта с подръчни противопожарни и съоръжения средства е съгласно Наредба № 2 за противопожарно строителни норми - приложение №2 т. 39

НН№2 Чл. 38. (1) За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограждения (парпети, капази, мрежи, екрани и др.) , прилагани при шахти, стълби, балкони, площадки, мостове, естакади, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, стърготини и др.

- 25. "Опасна зона" е всяка зона във и около работното оборудване и в работното място, в която съществува опасност за здравето или живота на работещите.
- 1. Подвижните и неподвижни опасни зони се определят от Техническият ръководител на обекта .
- 2. Опасните зони на работното оборудване се определят от работодателя и от Техническият ръководител на обекта.
- 3. Забранява се работа с машини за земни работи по терен с наклон, по- голям от предвидения в паспорта им.
- 4. За определяне на границите на зоната на отговорност при земни работи отговаря Проектанта на съоръжението.
- 5. При скорост на вятъра над 12м/сек освен преустановяване на СМР се забранява и всякакво движение на работниците в опасните зони;
- 6. Опасните зони да се маркират с необходимите знаци и сигнали, съгласно Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана.
- 7. При механизизирано извършване на земни работи, в зоната на действие на машината е забранено извършване на други видове строително - монтажни работи и преминаване на хора.
- 8. За ограждането и техническото оборудване на опасната зона , както и мерките за безопасност в нея отговорност носят Техническият ръководител, длъжностното лице по безопасност и отговорникът по изкопните работи.
- 9. По време на почивки или престои земекопните машини се разполагат на необходимото разстояние от зоната на естествено срутване. Кошът на багера се остава опрян на терена.
- 10. Необходимо е да се осигури безопасно влизане в изкопа и излизане от изкопа чрез инвентарни стълби, широки най- малко 0,7м и парпет излизащ на височина 1,0м над терена.
- 11. Работата на всички строителните машини и устройства да се извършва при условията на Наредба №2 - Глава втора.

- Зони на специфичен риск
- 1. При изпълнение на земни работи .
 - 2. При изпълнение на СМР в сервитута съществуващи проводни и съоръжения.
 - 3. При изпълнение на СМР при ремонт и изграждане на съоръжения.
- Изкопи
- 1. Изкопните работи се преустановяват при:
 - 1.1. откриване на неизвестни подземни мрежи или съоръжения до получаване на разрешение от собственика им;
 - 1.2. поява на условия, различни от предвидените, до изпълнение на съответните предписания на Проектанта;
 - 1.3. откриване на взривоопасни материали до получаване на разрешение от съответните органи.
 - 2. Извършването на изкопни работи или на други видове СМР в изкопи след временното им спиране или замразяван се възобновява по нареждане на Техническият ръководител след проверка за устойчивостта на откосите или укрепването им и отстраняване на констатираните неизправности и опасности.
 - 3. Преди започване на работа в изкопи с дълбочина, по-голяма от 1,5 m, Техническият ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите или укрепването.
 - 4. Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние, по-малко от 0,2 m от подземни мрежи или съоръжения.

Внимание!

Зоната на извършване на изкопи с дълбочина по - голяма от 1,5м е "ОПАСНА ЗОНА" !!!

СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН М 1:500

Важи за II-ри участък от пт. 201 до пт. 210 от км 3+127.54 до км 3+238.55 Съгласен съм с проекта !

Съгласувал ВЪЗЛОЖИТЕЛ :			
" ВЛАХОВ ИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД - ПЛЕВЕН			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ :	ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН		
ОБЕКТ: "Рехабилитация на Северен обходен път (Маркова могила - V-ти квартал), община Червен бряг." - актуализация			ЧАСТ : ПБЗ
ЧЕРТЕЖ :	СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН		МАЩАБ :
2.9 / 3	ДЛЪЖНОСТ :	ИМЕ :	1:500
	ПРОЕКТАНТ :	инж. Ю. Орлова инж. Л. Влахов	
	ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ :	инж. Цв. Влахов	
ДАТА : VIII.2016	УПРАВИТЕЛ :	инж.Цв.Влахов	ФАЗА : РИП

Настоящият чертеж е валиден само с мокър печат !

помещение съоръжение или инсталация	прахов пожарогасител - бкг	кофпомпа или водни пожарогасители за вода	съд за вода 200л	кофа
3	2	2	2	2

Копиране и размножаване-забранено !
